

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Каменского муниципального района
Воронежской области – заместитель
председателя Управляющего совета
(проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов


С.С. Ершов

ПРОТОКОЛ №9
заседания Управляющего совета (проектного комитета) по реализации
приоритетных проектов Каменского муниципального района
Воронежской области

от 5 июля 2019г.

Председательствовал

Заместитель главы администрации района
по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ – заместитель
председателя управляющего совета
С.С. Ершов

Присутствовали:

Руководитель муниципального проектного
офиса, – ответственный секретарь
управляющего совета - А.Ю. Макаренко

Члены управляющего совета:

Руководитель аппарата администрации
района - Е.Н. Райм

Начальник отдела по экономике,
промышленности и инвестициям - С.Н. Сыроватская

Руководитель отдела по финансам и
налогам администрации района - Ю.П. Мошуров

Начальник организационно-правового
отдела администрации района - О.Ю. Бежко

Начальник отдела по строительству,
архитектуре, транспорту, связи и ЖКХ - В.А. Буравлева

администрации района

Приглашенные:

Депутат Совета народных депутатов
Каменского муниципального района 7 - В.Д. Ударов
созыва

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение сводного отчёта о ходе реализации портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Каменского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2019г.

1. Утверждение сводного отчёта о ходе реализации портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Каменского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2019г.

(Макаренко А.Ю.)

1. Утвердить сводный отчёт о ходе реализации портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы Каменского муниципального района Воронежской области за 2 квартал 2019г. согласно Приложению №1

Голосовали:

За-8 против-0, воздержались-0.

Ответственный секретарь
управляющего совета,-
руководитель муниципального
проектного офиса


А.Ю.Макаренко

Приложение № 1
к протоколу заседания
Управляющего совета
по реализации приоритетных
проектов при администрации
Каменского муниципального района
Воронежской области
от 05.07.2019 № 9

**Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
Каменского муниципального района Воронежской области**

1. Общая характеристика состава портфеля проектов

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|---|-------------|---------------------------------------|--|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа» | | | |
| | Функциональный заказчик | Мосолов О.Н.,- руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области | | | |
| | Руководитель проекта | Бурляева А.Б.,- руководитель отдела образования, молодежной политики, спорта и туризма | | | |
| | Длительность проекта | 1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г. | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | инициация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 1622,94 | 0 | 0 | Проект находится на стадии инициации, отклонений нет |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|--|---|-------------|---------------------------------------|---|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа» | | | |
| | 2019 | 1622,94 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 1 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 2 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | - | - | - | |
| | 2021 | - | - | - | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц | 1 | 0 | 0 | Показатель будет исполнен в конце 2019г. |
| | 2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | 0,083 | 0 | 0 | Показатель будет исполнен в конце 2019г. |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта «Современная школа» | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | Реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|--|---|-------------|---------------------------------------|---|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды» | | | |
| | Функциональный заказчик | Мамаев В.В. - заместитель руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | | | |
| | Руководитель проекта | Т.Н.Терехова,- помощник главы администрации Каменского городского поселения | | | |
| | Длительность проекта | 15.01.2019г. - 31.12.2019г. | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 4483,92 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 4483,92 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 1 квартала финансирования проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 2 квартала финансирования проекта не запланировано |
| | 2020 | - | - | - | |
| | 2021 | - | - | - | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий включенных в программы формирования современной городской среды Каменского муниципального района | 1 | 0 | 0 | |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Формирование комфортной городской среды» | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|--|-------------|---------------------------------------|--|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Цифровая культура» | | | |
| | Функциональный заказчик | Суачёва Э.А. – руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| | Руководитель проекта | С.И. Бурляев, заместитель главы администрации района по социальным вопросам – руководитель отдела по культуре администрации Каменского муниципального района Воронежской области | | | |
| | Длительность проекта | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2021 | 0 | 0 | 0 | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 | |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|-----------------------------------|--|-------------|--|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Цифровая культура» | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|--|-------------|--|---|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Творческие люди» | | | |
| | Функциональный заказчик | Сухачёва Э.А. – руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| | Руководитель проекта | С.И. Бурляев, заместитель главы администрации района по социальным вопросам – руководитель отдела по культуре администрации Каменского муниципального района Воронежской области | | | |
| | Длительность проекта | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 350 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 50 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта в 1 квартале финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта в 1 квартале финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | 150 | 0 | 0 | |
| | 2021 | 150 | 0 | 0 | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1.Количество специалистов, прошедших повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.) нарастающим итогом | 5 | 0 | 0 | |
| | 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу | 15 | 0 | 0 | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|--|--|-------------|--|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Творческие люди» | | | |
| | «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | | | | |
| Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|---|-------------|--|---|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Культурная среда» | | | |
| | Функциональный заказчик | Сухачёва Э.А. – руководитель департамента культуры Воронежской области | | | |
| | Руководитель проекта | С.И. Бурляев, заместитель главы администрации района по социальным вопросам – руководитель отдела по культуре администрации Каменского муниципального района Воронежской области | | | |
| | Длительность проекта | 01.01.2019-31.12.2021 | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 19578,8 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 18337,4 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта в 1 квартале финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках проекта в 1 квартале финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | 616,6 | 0 | 0 | |
| | 2021 | 624,8 | 0 | 0 | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1.Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом) | 2 | 0 | 0 | |
| | 2.Количество организаций культуры, получивших со- | 0 | 0 | 0 | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|---|-------------|--|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 * 100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Культурная среда» | | | |
| | временное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) | | | | |
| | Цель (целевой показатель): Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом) | | | | |
| | В процентах | 100 | 0 | 0 | |
| | В тыс. чел. | 84,785 | 0 | 0 | |
| | в том числе | | | | |
| | Количество посещений музеев, тыс. чел. | 4,653 | 0 | 0 | |
| | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел. | 52,475 | 0 | 0 | |
| | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел. | 25,513 | 0 | 0 | |
| | Количество участников клубных формирований, тыс. чел. | 2,011 | 0 | 0 | |
| | Количество учащихся ДШИ, тыс. чел. | 0,133 | 0 | 0 | |
| Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Наименование проекта | Муниципальная составляющая Каменского муниципального района регионального проекта Воронежской области «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры на территории Воронежской области» «Культурная среда» | | | |
| | Статус реализации проекта | реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|--|--|-------------|---------------------------------------|---|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ №2» | | | |
| | Функциональный заказчик | Бурляев С.И. - заместитель главы администрации района по социальным вопросам, руководитель отдела по культуре | | | |
| | Руководитель проекта | Ершов С.С., - заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ | | | |
| | Длительность проекта | 06.03.2019г.-31.08.2019г. | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | инициация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 150300 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 150300 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 1 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 2 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | - | - | - | |
| | 2021 | - | - | - | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 8.3 | 0 | 0 | Показатель будет исполнен после реализации проекта |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|----------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | плановое* | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Наименование проекта | Капитальный ремонт МБОУ «Каменская СОШ №2» | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | Реализуется успешно | | | |


| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|--|-------------|---------------------------------------|---|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Наименование проекта | Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Коденцово | | | |
| | Функциональный заказчик | Ершов С.С., - заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ | | | |
| | Руководитель проекта | Бойко И.Т. – глава Коденцовского сельского поселения | | | |
| | Длительность проекта | 16.11. 2018г. – 01.11.2019г. | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 2211 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 2211 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 1 квартала финансирования проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 2 квартала финансирования проекта не запланировано |
| | 2020 | - | - | - | |
| | 2021 | - | - | - | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Доля протяженности в Каменском муниципальном районе водопроводной сети, нуждающейся в замене | 75 | 0 | 0 | Показатель будет исполнен после реализации проекта |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭс) | 1 | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|----------------------------------|--|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | Планировочное | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Наименование проекта | Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Колеицово | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | Реализуется успешно | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|---|--|-------------|---------------------------------------|---|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Наименование проекта | Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Евдаково | | | |
| | Функциональный заказчик | Ершов С.С., - заместитель главы администрации района по строительству, промышленности, транспорту, связи и ЖКХ | | | |
| | Руководитель проекта | Скрипникова Т.В. – глава Евдаковского сельского поселения | | | |
| | Длительность проекта | 16.11. 2018г. – 01.11.2019г. | | | |
| | Фаза жизненного цикла проекта | реализация | | | |
| | Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. | 2013 | 0 | 0 | |
| | 2019 | 2013 | 0 | 0 | |
| | 1 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 1 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2 квартал 2019г. | 0 | 0 | 0 | В рамках 2 квартала финансирование проекта не запланировано |
| | 2020 | - | - | - | |
| | 2021 | - | - | - | |
| | ... | | | | |
| | Показатели проекта | | | | |
| | 1. Доля протяженности в Каменском муниципальном районе водопроводной сети, нуждающейся в замене | 75 | 0 | 0 | Показатель будет исполнен после реализации проекта |
| | Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде | | | | |

| № | Общие сведения о проекте | Значение показателей проекта | | | Примечание |
|---|-----------------------------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|
| | | Плановое годовое | фактическое | отклонение, % (гр. 4 / гр. 3 *100) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Наименование проекта | Текущий ремонт сетей водоснабжения и замена башни Рожновского в с. Евдаково | | | |
| | Своевременность реализации (КПЭС) | 1 | | | |
| | Достижение целей (КПЭц) | 1 | | | |
| | Соблюдение бюджета (КПЭб) | 0 | | | |
| | Достижение результатов (КПЭр) | 1 | | | |
| | Статус реализации проекта | Реализуется успешно | | | |

2. Динамики состава портфеля по статусам реализации проектов

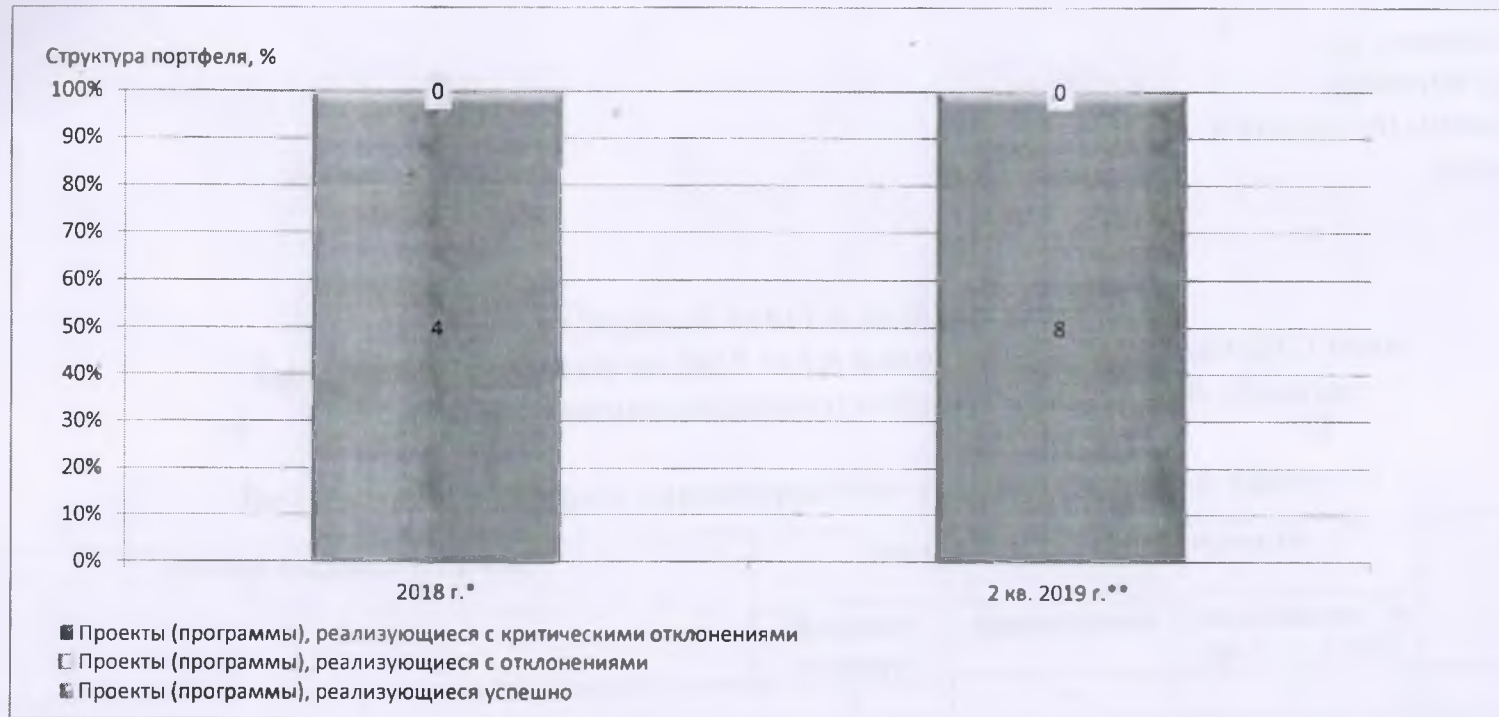

*Базовый - 2018 год

**Заполняется нарастающим итогом
